



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
"INVIPASTO"


PROYECTO SINDAGUA

INFORME DE AVANCE A : 30 DE NOVIEMBRE 2013

VIVIENDAS TERMINADAS ESTRUCTURA	PORCENTAJE EN ESTRUCTURA	VIVIENDAS PARA ENTREGAR	PORCENTAJE EN ACABADOS	TOTAL EDIFICIOS CONSTRUIDOS
332	81%	188	46%	7
PERSONAL EMPLEADO		PORCENTAJE OBRAS DE URBANISMO		1.5%
ADMINISTRATIVOS	7	TOTAL AVANCE PONDERADO DE OBRA		64%
MAESTROS	9			
OBREROS	281			
TOTAL PERSONAL	297			
PROYECTO	TOTAL VIVIENDAS			
NUEVA SINDAGUA	406			



Panorámica del Proyecto

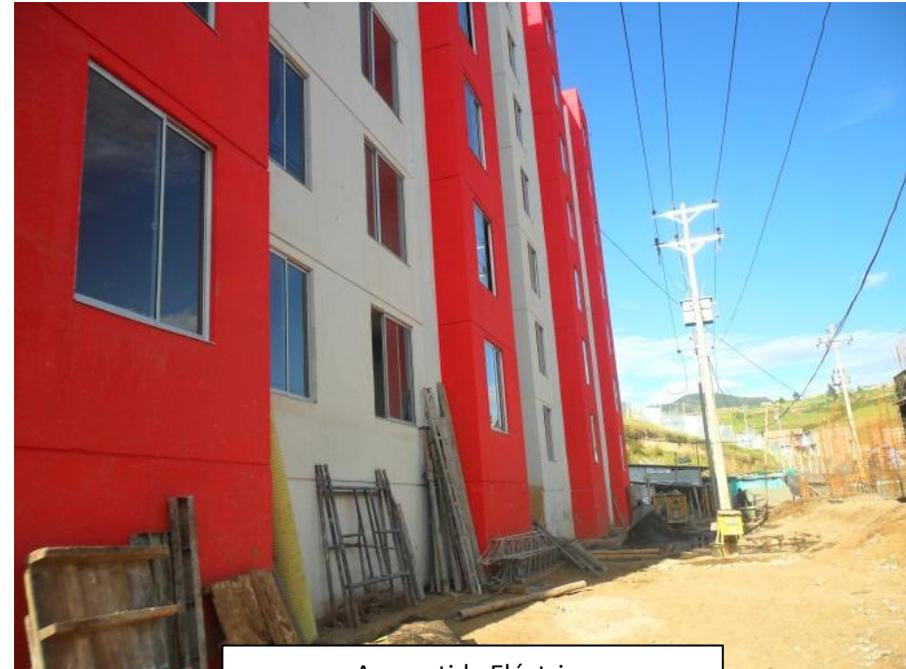

Acometida Eléctrica



ALCALDÍA DE PASTO



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
"INVIPASTO"

PROYECTO SINDAGUA					
INFORME DE AVANCE A : 30 DE OCTUBRE 2013					
PROYECTO	TOTAL VIVIENDAS	VIVIENDAS TERMINADAS EN ESTRUCTURA	VIVIENDAS PARA ENTREGAR	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL EDIF. CONSTRUIDOS
NUEVA SINDAGUA	406	298	144	73%	6
PERSONAL EMPLEADO				PORCENTAJE OBRAS DE URBANISMO	12%
ADMINISTRATIVOS	7				
MAESTROS	8				
OBREROS	361				
TOTAL PERSONAL	376				



Torre Terminada



Panorámica del proyecto



ALCALDÍA DE PASTO



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
"INVIPASTO"



Proceso constructivo formaleteo de Muros



Desencoframiento de Muros



ALCALDÍA DE PASTO



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
"INVIPASTO"

PROYECTO SINDAGUA					
INFORME DE AVANCE A : 30 DE SEPTIEMBRE 2013					
PROYECTO	TOTAL VIVIENDAS	VIVIENDAS TERMINADAS EN ESTRUCTURA	VIVIENDAS PARA ENTREGAR	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL EDIF. CONSTRUIDOS
NUEVA SINDAGUA	406	276	0	67%	6
PERSONAL EMPLEADO				PORCENTAJE OBRAS DE URBANISMO	12%
ADMINISTRATIVOS	7				
MAESTROS	8				
OBREROS	350				
TOTAL PERSONAL	365				



Proceso Constructivo Acero de Refuerzo Torre 3



Proceso Constructivo Pintura



ALCALDÍA DE PASTO



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
“INVIPASTO”

INFORME DE AVANCAE A : 30 DE AGOSTO 2013

PROYECTO	TOTAL VIVIENDAS	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL EDIFICIOS CONSTRUIDOS
NUEVA SINDAGUA	406	264	65%	6
PERSONAL EMPLEADO			PORCENTAJE OBRAS DE URBANISMO	10%
ADMINISTRATIVOS	7			
MAESTROS	8			
OBREROS	350			
TOTAL PERSONAL	365			



Proceso Productivo Pintura de placa Torre 6



Panorámica del Proyecto



ALCALDÍA DE PASTO



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
"INVIPASTO"

Informe Julio
2013



Panorámica del conjunto



Iniciando enchapes en edificio 4



Iniciando pintura edificio 5



ALCALDÍA DE PASTO



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
"INVIPASTO"

**Informe a 8 de
Junio de 2013**





ALCALDÍA DE PASTO



ALCALDIA DE PASTO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO
“INVIPASTO”

